ID		WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1		**1**	**COMMESSA STANDARD**	**35.88 g**	**mer 11.07.07**	**mer 29.08.07**
2		**1.1**	**AMMINISTRAZIONE**	**0.5 g**	**mer 11.07.07**	**mer 11.07.07**
3		1.1.1	BOLLE E FATTURAZIONE	4 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
4		1.1.2	PREVENTIVO, DOCUMENTAZIONE E CERT.	4 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
5		**1.2**	**UFFICIO TECNICO**	**13.75 g**	**mer 11.07.07**	**lun 30.07.07**
6		1.2.1	RILIEVO MISURE	4 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
7		1.2.2	CALCOLI STATICI	24 h	mer 11.07.07	lun 16.07.07
8		1.2.3	PROG. DEFINITIVO	32 h	lun 16.07.07	ven 20.07.07
9		1.2.4	VERIFICA DEL COMMITT. PROG. DEFINITIVO	24 h	ven 20.07.07	mer 25.07.07
10		1.2.5	PROG. ESECUTIVO	8 h	mer 25.07.07	gio 26.07.07
11		1.2.6	VERIFICA DEL COMMITT. PROG. ESECUTIVO	8 h	gio 26.07.07	ven 27.07.07
12		1.2.7	DISTINTE DI PRODUZIONE	8 h	ven 27.07.07	lun 30.07.07
13		1.2.8	VERIFICHE DISTINTE PRODUZIONE	2 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
14		**1.3**	**UFFICIO ACQUISTI**	**12.75 g**	**gio 12.07.07**	**lun 30.07.07**
15		1.3.1	ORDINE TRAVI	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
16		1.3.2	ORDINE FERRO	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
17		1.3.3	ZINCATURA CARP. FERRO	56 h	gio 12.07.07	lun 23.07.07
18		1.3.4	ORDINE FERRAMENTA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
19		1.3.5	ORDINE PERLINE	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
20		1.3.6	ORDINE LISTELLI	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
21		1.3.7	ORDINE COIBENTE	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
22		1.3.8	ORDINE OSB	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
23		1.3.9	ORDINE GUAINA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
24		1.3.10	ORDINE TEGOLE	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
25		1.3.11	ORDINE LATTONERIA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
26		**1.4**	**PRODUZIONE**	**3.88 g**	**mer 11.07.07**	**lun 16.07.07**
27		1.4.1	LAV.-IMPREGNAZIONE TRAVI	8 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
28		1.4.2	IMPREGNAZIONE PERLINE	8 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
29		1.4.3	SCARICO MATERIALE C/O NS. DEPOSITO	1 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
30		1.4.4	PREPARAZIONE CARP. FERRO	8 h	mer 11.07.07	gio 12.07.07
31		1.4.5	CARICO CARP. FERRO DA ZINCARE	1 h	gio 12.07.07	gio 12.07.07
32		1.4.6	RITIRO E SCARICO LATTONERIA	2 h	mer 11.07.07	mer 11.07.07
33		1.4.7	CONTROLLO MATERIALI	4 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
34		1.4.8	CARICO TRAVI X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
35		1.4.9	CARICO PERLINE X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
36		1.4.10	CARICO CARP. FERRO X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
37		1.4.11	CARICO FERRAMENTA X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
38		1.4.12	CARICO LISTELLI X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
39		1.4.13	CARICO COIBENTE X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
40		1.4.14	CARICO OSB X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
41		1.4.15	CARICO GUAINA X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
42		1.4.16	CARICO TEGOLE X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
43		1.4.17	CARICO LATTONERIA X CONSEGNA	1 h	lun 16.07.07	lun 16.07.07
44		**1.5**	**MONTAGGIO IN CANTIERE**	**30 g**	**mar 17.07.07**	**mar 28.08.07**
45		1.5.1	SCARICO TRAVI	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
46		1.5.2	SCARICO PERLINE	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
47		1.5.3	SCARICO CARP. FERRO	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
48		1.5.4	SCARICO FERRAMENTA	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
49		1.5.5	SCARICO LISTELLI	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
50		1.5.6	SCARICO COIBENTE	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
51		1.5.7	SCARICO OSB	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
52		1.5.8	SCARICO GUAINA	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
53		1.5.9	SCARICO TEGOLE	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
54		1.5.10	SCARICO LATTONERIA	1 h	mar 17.07.07	mar 17.07.07
55		1.5.11	STAFFAGGIO	8 h	mer 18.07.07	mer 18.07.07
56		1.5.12	MONTAGGIO STRUTTURA	40 h	lun 30.07.07	lun 06.08.07
57		1.5.13	MONT. COPERTURA	80 h	lun 30.07.07	lun 13.08.07
58		1.5.14	MONT. GRONDE	8 h	lun 13.08.07	mar 14.08.07
59		1.5.15	POSA GUAINE	32 h	mar 14.08.07	lun 20.08.07
60		1.5.16	MONTAGGIO TEGOLE	40 h	lun 20.08.07	lun 27.08.07
61		1.5.17	MONTAGGIO SCOSSALINE	8 h	lun 27.08.07	mar 28.08.07
62		**1.6**	**CONTROLLI IN CANTIERE**	**16.25 g**	**lun 06.08.07**	**mer 29.08.07**
63		1.6.1	CHECK MONTAGGIO STRUTTURA	2 h	lun 06.08.07	mar 07.08.07
64		1.6.2	CHECK MONTAGGIO COPERTURA	2 h	lun 13.08.07	mar 14.08.07
65		1.6.3	CHECK MONTAGGIO GRONDE	2 h	mar 14.08.07	mer 15.08.07
66		1.6.4	CHECK MONTAGGIO TEGOLE	2 h	lun 27.08.07	mar 28.08.07
67		1.6.5	FINE LAVORI	2 h	mar 28.08.07	mer 29.08.07
68		**1.7**	**APPALTI**	**0.13 g**	**lun 30.07.07**	**lun 30.07.07**
69		1.7.1	APPALTO MONTAGGIO STRUTTURA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
70		1.7.2	APPALTO MONTAGGIO COPERTURA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
71		1.7.3	APPALTO MONTAGGIO GUAINA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
72		1.7.4	APPALTO MONTAGGIO TEGOLE	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
73		1.7.5	APPALTO MONTAGGIO LATTONERIA	1 h	lun 30.07.07	lun 30.07.07
74		**1.8**	**TRASPORTI**	**3.63 g**	**gio 12.07.07**	**mar 17.07.07**
75		1.8.1	TRASPORTO IN ZINCATURA	8 h	gio 12.07.07	ven 13.07.07
76		1.8.2	RITIRO DA ZINCATURA	8 h	ven 13.07.07	lun 16.07.07
77		1.8.3	TRASPORTI TRAVI IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
78		1.8.4	TRASPORTI PERLINE IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
79		1.8.5	TRASPORTI CARP. FERRO IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
80		1.8.6	TRASPORTI FERRAMENTA IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
81		1.8.7	TRASPORTI LISTELLI IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
82		1.8.8	TRASPORTI COIBENTE IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
83		1.8.9	TRASPORTO OSB IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
84		1.8.10	TRASPORTO GUAINA IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
85		1.8.11	TRASPORTO TEGOLE IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
86		1.8.12	TRASPORTO LATTONERIA IN CANTIERE	8 h	lun 16.07.07	mar 17.07.07
87		**1.9**	**NOLEGGI**	**31 g**	**mar 17.07.07**	**mer 29.08.07**
88		1.9.1	AUTOGRU X SCARICO IN CANTIERE	8 h	mar 17.07.07	mer 18.07.07
89		1.9.2	AUTOGRU MONTAGGIO STRUTTURA	8 h	gio 19.07.07	gio 19.07.07
90		1.9.3	GRU SOLL. MATERIALI COPERT.	8 h	mar 28.08.07	mer 29.08.07
91		1.9.4	CESTELLI PORTAPERSONE O PONTEGGI	8 h	mar 28.08.07	mer 29.08.07

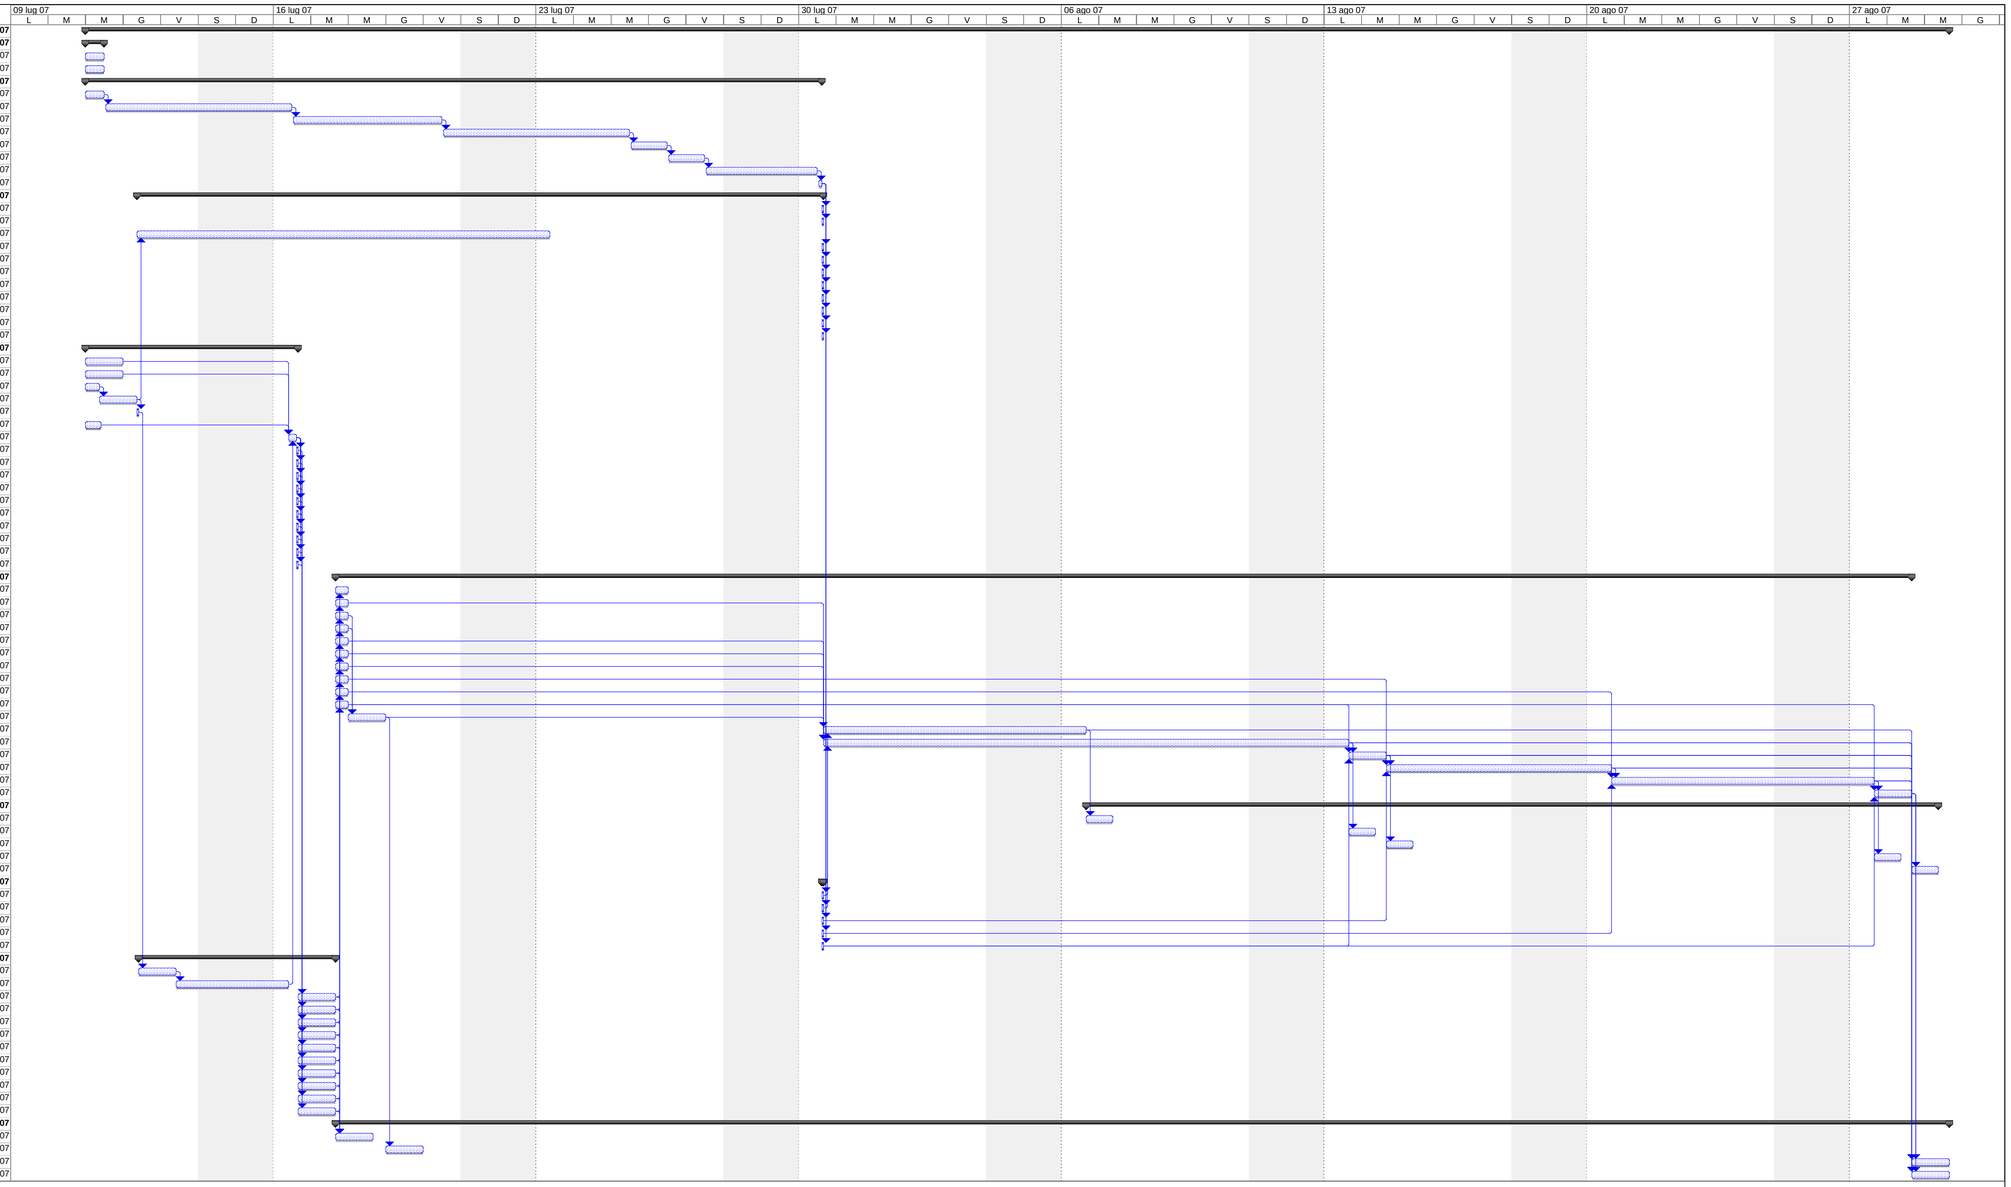

Data: mar 17.02.15

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Divisione | Avanzamento | Cardine
